



ISO-E+



不合格

测试时间 : 2020-04-30 14:36:46
工程 : Default
前缀 : Certification
操作者 : Default
线缆类型 / NVP : CAT 6 UTP, 68%
连接器 : UTP Mod Jack 6

限值 : ISO - Class E Channel (++)
型号 : TestPro CV100
序列号 : 主机: 5200-1251, 远端机: 5200-1252
设备软件 : 2.8.R5
校准日期 : 2018-11-02
主机适配器 : Validator Multi-Gig/POE
远端机适配器 : Validator Multi-Gig/POE

参数	结果	线对	数值	限值
长度(m)	信息	36	20.9	100.0
传输时延(ns)	合格	12	107.0	555.0
时延偏差(ns)	合格	12	5.0	50.0
环路电阻(Ω)	不合格	45	76.779	25.000
线对间不平衡电阻(Ω)	合格	36-45	0.718	1.519
线对内不平衡电阻(Ω)	不合格	45	73.639	0.651




T568B


射频参数

参数	结果	主机							远端机						
		最差余量				最差值			最差余量				最差值		
		线对	余量 (dB)	限值 (dB)	频率 (MHz)	线对	数值 (dB)	频率 (MHz)	线对	余量 (dB)	限值 (dB)	频率 (MHz)	线对	数值 (dB)	频率 (MHz)
回波损耗	不合格	45	-8.1	19.0	2.35	45	10.9	1.60	45	-5.5	19.0	5.50	45	12.5	1.15
插入损耗	合格	45	0.8	4.0	3.70	45	8.8	249.00	45	-	-	-	45	-	-
NEXT	合格	45-78	8.9	38.7	118.50	36-45	42.7	250.00	36-45	6.2	33.5	237.00	36-45	39.7	237.50
PSNEXT	合格	78	11.3	35.8	118.50	45	41.7	250.00	45	7.7	30.6	237.00	45	38.2	237.50
ACRF	合格	45-12	3.5	63.3	1.00	36-45	34.3	199.00	12-78	13.8	54.8	2.65	36-45	32.7	201.00
PSACRF	合格	78	16.7	49.4	3.55	45	32.3	233.50	45	15.6	22.0	82.25	45	30.7	227.50
TCL	不合格	45	-22.6	40.0	5.20	45	16.9	39.00	45	-21.8	40.0	1.00	45	18.2	1.00
TCTL	不合格	45	-14.3	30.0	1.00	45	13.8	5.20	45	-15.8	30.0	1.00	45	13.2	16.15
ACRN	合格	45-78	12.9	60.7	3.10	36-45	33.9	250.00	12-45	16.3	58.3	4.30	36-45	31.2	237.50
PSACRN	合格	45	13.0	58.0	3.10	45	33.2	250.00	45	17.4	55.9	4.30	45	29.6	237.50


插入损耗

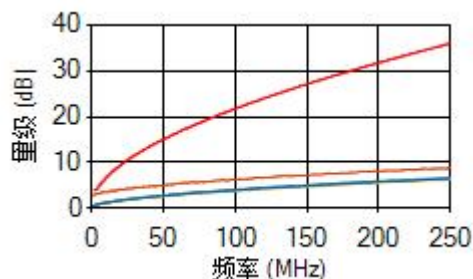


回波损耗

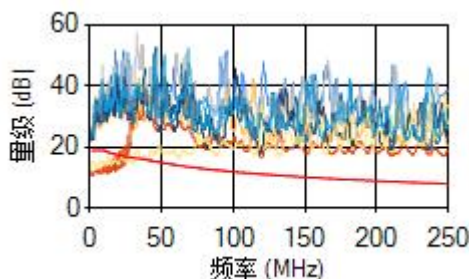


NEXT

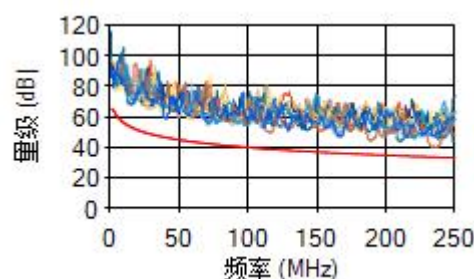

TCL

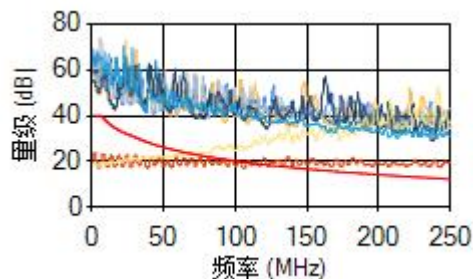

ACRF

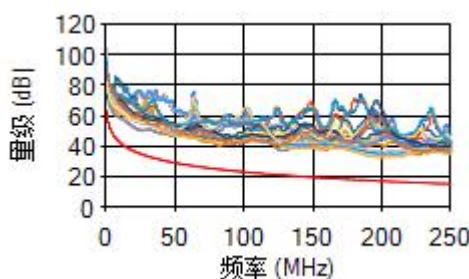

ACRN

